


REGIONE ABRUZZO

CENTRO OPERATIVO REGIONALE (COR)

(Istituito con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 555 del 30/08/2016)

SISMA ITALIA CENTRALE 2016-2017 – REPORT

(aggiornato al 27 luglio 2017)

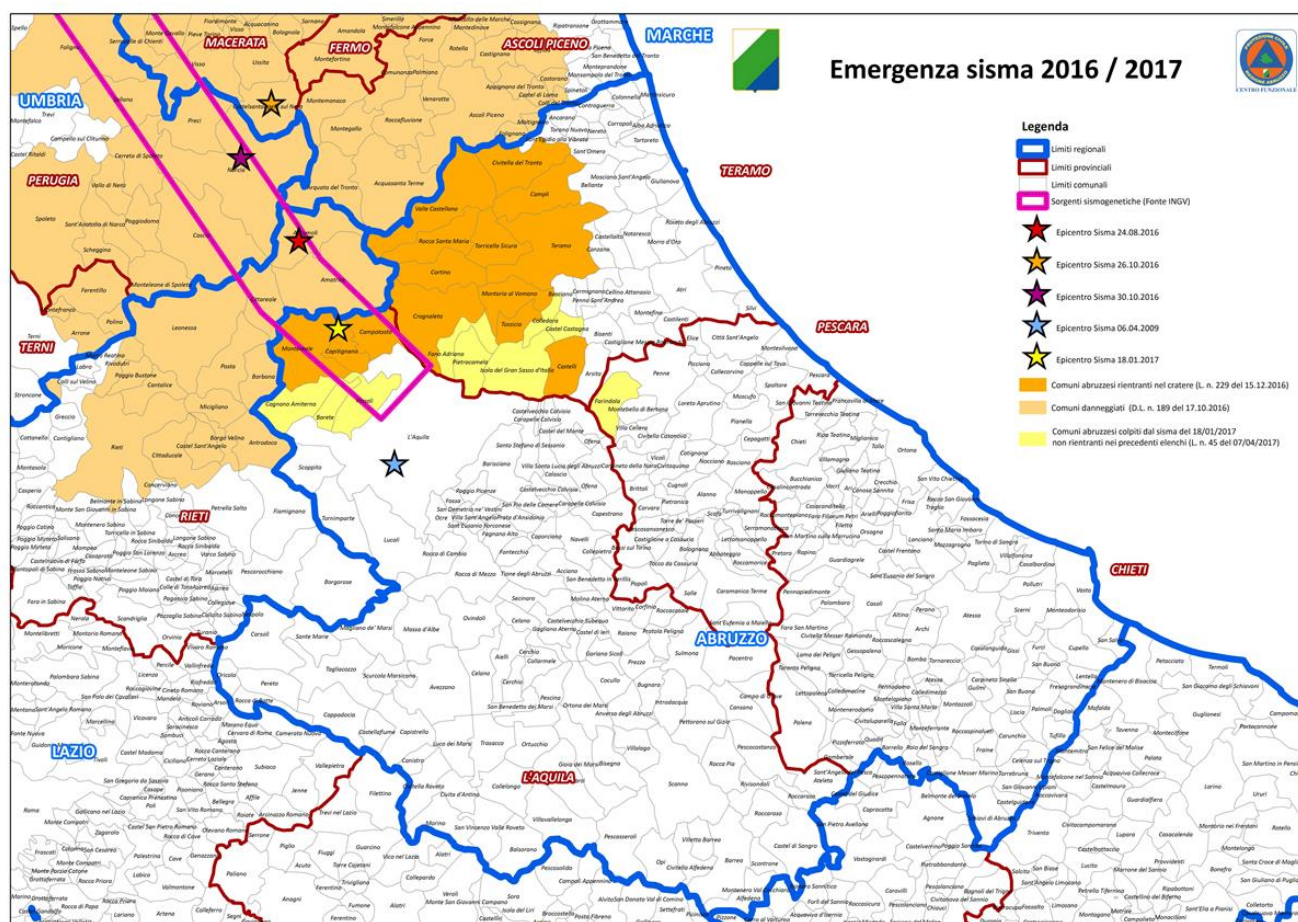



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

INDICE

ISTANZE DI SOPRALLUOGO	3
RIEPILOGO ESITI SOPRALLUOGHI FAST	4
RIEPILOGO ESITI SOPRALLUOGHI AEDES	5
SOPRALLUOGHI AEDES EDIFICI PUBBLICI.....	6
SOPRALLUOGHI AEDES EDIFICI SCOLASTICI.....	7
SOPRALLUOGHI EDIFICI DI CULTO (MIBACT)	7
PERSONE ASSISTITE	10
STRUTTURE RICETTIVE	10
C.A.S.	11
S.A.E.	12
ACQUISIZIONE UNITÀ IMMOBILIARI	19
M.A.P.R.E.	20
ZOOTECNIA.....	21
SMALTIMENTO DELLE MACERIE DERIVANTI DA CROLLI E/O DEMOLIZIONI DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI	23



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

ISTANZE DI SOPRALLUOGO

Il numero di istanze di primo sopralluogo della Regione Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 risulta all'incirca pari a 34.700 alla data del 13 marzo 2017, data ultima fissata per le richieste di sopralluogo. Alcune di queste richieste sono state evase con sopralluoghi AeDES prima dell'introduzione dei sopralluoghi FAST (OCDPC n. 405 del 10 novembre 2016) volti alla redazione della scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post Terremoto sugli edifici privati.

Alla data odierna, il numero di istanze di primo sopralluogo da evadere con procedura FAST ammonta a 1.199 e si prevede il completamento entro la metà di settembre compatibilmente col numero di squadre di rilevatori FAST fornito settimanalmente dalla Struttura di Missione.

Il numero dei sopralluoghi AEDES ancora da eseguire è pari a 1.531; tale dato è in continua evoluzione in quanto dipendente dall'esito dei sopralluoghi FAST. Alcuni sopralluoghi FAST, infatti, richiedono l'approfondimento AEDES o attribuiscono l'esito "*edificio non utilizzabile per solo rischio esterno*" che comporta un nuovo sopralluogo a mezzo di scheda AEDES. Il completamento dei sopralluoghi AeDES dipende dal numero di squadre AeDES che la Struttura di Missione assegna alla Regione Abruzzo.

Di seguito i dati riepilogativi:

ISTANZE DI PRIMO SOPRALLUOGO (stima)	ISTANZE EVASE CON PROCEDURA AEDES (prima del 15/11/2016) ^(*)	ISTANZE EVASE CON PROCEDURA FAST (dopo il 15/11/2016) ^(*)	ISTANZE RIMANENTI DA EVADERE CON PROCEDURA FAST	ISTANZE DA EVADERE CON PROCEDURA AEDES
34.700	5.697	27.804	1.199	1.531

^(*) data di entrata in vigore della OCDPC n. 405 del 10/11/2016



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

RIEPILOGO ESITI SOPRALLUOGHI FAST

SISMA 2016/2017 - ESITI SOPRALLUOGHI FAST DATI AGGIORNATI AL 17/07/2017										
	AGIBILE		NON UTILIZZABILE		NON UTILIZZABILE PER SOLO RISCHIO ESTERNO		TOTALE CON ESITO	Esito NON attribuito		TOT. EDIFICI
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	N.	%	N.
L'AQUILA	3612	61%	1980	34%	283	5%	5875	1174	17%	7049
PESCARA	1927	66%	929	32%	76	3%	2932	887	23%	3819
TERAMO	7882	61%	4540	35%	458	4%	12880	3936	23%	16816
CHIETI	86	172%	3	15%	11	13%	100	20	17%	120
ABRUZZO	13507	62%	7452	34%	828	4%	21787	6017	22%	27804




GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it


RIEPILOGO ESITI SOPRALLUOGHI AEDES

SISMA 2016/2017 ESITI SOPRALLUOGHI AEDES													
Dati aggiornati al 17/07/2017													
	ESAMINATI	AGIBILI	INAGIBILI	B	C	D	E	B + F	A+F	C + F	D + F	E + F	SENZA ESITO
PROVINCIA DI CHIETI	5	0	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
EDIFICI PUBBLICI	3	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
EDIFICI PRIVATI	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
PROVINCIA DI L'AQUILA	2065	1185	791	340	31	222	5	28	99	4	0	62	89
EDIFICI PUBBLICI	182	144	36	28	3	4	0	0	1	0	0	0	2
EDIFICI PRIVATI	1772	956	729	297	26	216	5	28	91	4	0	62	87
SCUOLE	111	85	26	15	2	2	0	0	7	0	0	0	0
PROVINCIA DI PESCARA	236	147	86	39	17	17	0	1	3	1	0	8	3
EDIFICI PUBBLICI	18	11	7	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
EDIFICI PRIVATI	171	110	58	24	10	11	0	1	3	1	0	8	3
SCUOLE	47	26	21	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0
PROVINCIA DI TERAMO	6935	3449	3393	1312	287	1213	9	115	268	15	3	171	93
EDIFICI PUBBLICI	361	197	162	78	16	57	0	2	6	1	0	2	2
EDIFICI PRIVATI	6176	3007	3081	1134	257	1131	5	110	260	13	3	168	88
SCUOLE	398	245	150	100	14	25	4	3	2	1	0	1	3
TOTALE	9241	4781	4275	1692	336	1454	14	145	370	20	3	241	185


Sopralluoghi AeDES Edifici Privati

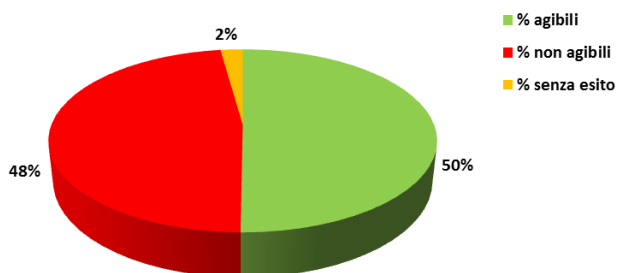

Sopralluoghi AeDES Edifici Pubblici

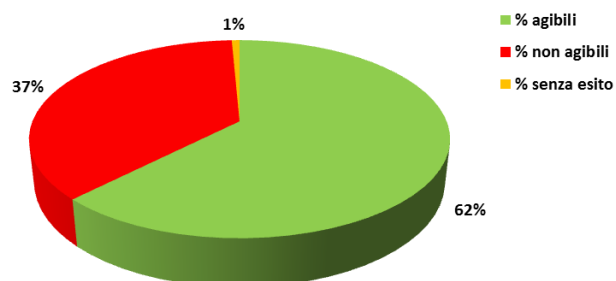

Sopralluoghi AeDES Scuole

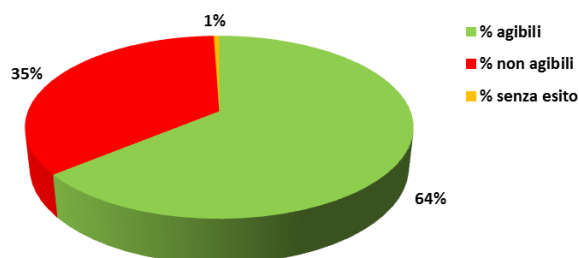



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

SOPRALLUOGHI AEDES EDIFICI PRIVATI

SISMA 2016/2017 SOPRALLUOGHI EDIFICI PRIVATI				
Dati aggiornati al 17 luglio 2017				
PROVINCIA	ESAMINATI	AGIBILI	INAGIBILI	SENZA ESITO
Chieti	2	0	2	0
L'Aquila	1772	956	729	87
Pescara	171	110	58	3
Teramo	6176	3007	3081	88
Totale	8121	4073	3870	178

SOPRALLUOGHI AEDES EDIFICI PUBBLICI

SISMA 2016/2017 SOPRALLUOGHI EDIFICI PUBBLICI (municipi, caserme, strutture sanitarie, sedi di Prefettura, Provincia, Regione ecc.)				
Dati aggiornati al 17 luglio 2017				
PROVINCIA	ESAMINATI	AGIBILI	INAGIBILI	SENZA ESITO
Chieti	3	0	3	0
L'Aquila	182	144	36	2
Pescara	18	11	7	0
Teramo	361	197	162	2
Totale	564	352	208	4



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

SOPRALLUOGHI AEDES EDIFICI SCOLASTICI

SISMA 2016/2017 SOPRALLUOGHI EDIFICI SCOLASTICI					
Dati aggiornati al 17 luglio 2017					
PROVINCIA	ESAMINATI	AGIBILI	INAGIBILI	INAGIBILI CON ESITO E O E/F	Senza Esito
L'Aquila	111	85	26	2	0
Pescara	47	26	21	5	0
Teramo	398	245	150	26	3
TOTALE	556	356	197	33	3

SOPRALLUOGHI EDIFICI DI CULTO (MIBACT)

SISMA 2016/2017 SOPRALLUOGHI EDIFICI DI CULTO ESEGUITI DAL MIBACT (sulla base dei dati messi a disposizione dal MIBACT a questo COR)			
Dati aggiornati al 17 luglio 2017			
PROVINCIA	AGIBILI	NON AGIBILI	TOTALE
L'Aquila	52	101	153
Chieti	9	13	22
Pescara	12	22	34
Teramo	57	231	288
TOTALE	130	367	497




GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it


BENI CULTURALI

RIEPILOGO GENERALE ATTIVITA' IN CORSO

BENI CULTURALI - RIEPILOGO GENERALE ATTIVITA' IN CORSO					
Dati aggiornati al 20 luglio 2017					
REGIONE	SEGNALAZIONI				
	segnalazioni totali fino al 10/01/17	segnalazioni prima del 30/10/16	segnalazioni dal 30/10/16 al 10/01/17	segnalazioni ripetute dopo il 30/10/16	segnalazioni dopo il 10/01/17
ABRUZZO	785	390	153	43	199

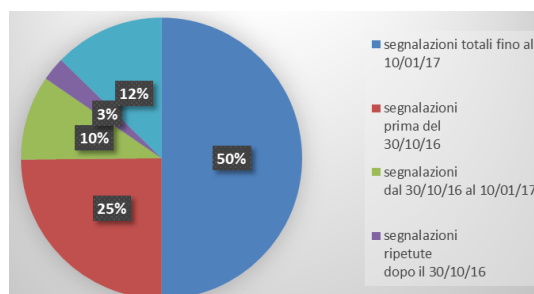

BENI CULTURALI - RIEPILOGO GENERALE ATTIVITA' IN CORSO				
Dati aggiornati al 20 luglio 2017				
RILIEVO del danno				GTS (n. soprall.)
RILIEVI 1° LIV.	RILIEVI 2° LIV prima del 30/10/16	RILIEVI 2° LIV.dopo il 30/10/16	RILIEVI 2° LIV. Dal 16/01/2017	
166	327	62	608	88

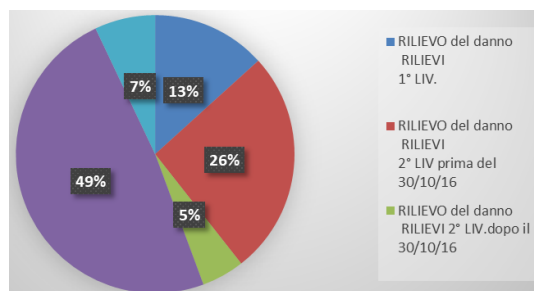




GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

BENI CULTURALI - RIEPILOGO GENERALE ATTIVITA' IN CORSO			
Dati aggiornati al 20 luglio 2017			
RECUPERO BENI MOBILI			
n. beni immobili interessati	n. beni mobili recuperati	Beni Archivistici (m.l.)	Beni librari (n. volumi)
22	265	110	0

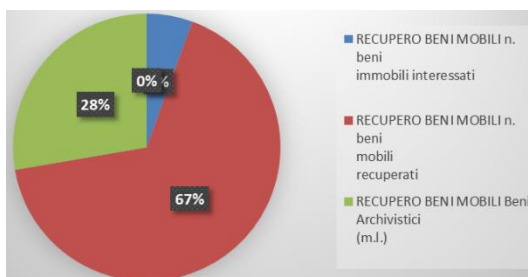

BENI CULTURALI - RIEPILOGO GENERALE ATTIVITA' IN CORSO					
Dati aggiornati al 20 luglio 2017					
MESSA IN SICUREZZA BENI IMMOBILI					
Mibact + VVF					Art.6 DL 205/2016
terminati	in corso	in fase di avvio	sospesi	TOTALI	
19	29	0	0	48	93



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

**PERSONE ASSISTITE
STRUTTURE RICETTIVE**

Persone assistite in sistemazione alberghiera al 01/10/2016

PROVINCIA	NUMERO ASSISTITI
L'AQUILA	0
TERAMO	2
PESCARA	0
ABRUZZO	2

Persone assistite in sistemazione alberghiera al 31/12/2016

PROVINCIA	NUMERO ASSISTITI
L'AQUILA	2
TERAMO	627
PESCARA	4
ABRUZZO	633

Persone assistite in sistemazione alberghiera al 17/07/2017

PROVINCIA	NUMERO ASSISTITI
CHIETI	4
L'AQUILA	19
TERAMO	1352
PESCARA	17
ABRUZZO	1392

SOMME EROGATE AL 17/07/2017	€ 7.675.001,51
STIMA SPESE DA SOSTENERE AL 30/08/2017	€ 13.118.800,82
STIMA SPESE DA SOSTENERE AL 30/10/2017	€ 15.118.800,82



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

C.A.S.

(Contributo di Autonomia Sistemazione)

Persone in C.A.S. al 01/10/2016

PROVINCIA	NUMERO ASSISTITI
L'AQUILA	19
TERAMO	385
PESCARA	5
ABRUZZO	409

Persone in C.A.S. al 31/12/2016

PROVINCIA	NUMERO ASSISTITI
L'AQUILA	50
TERAMO	3173
PESCARA	65
ABRUZZO	3288

Persone in C.A.S. al 17/07/2017

PROVINCIA	NUMERO ASSISTITI
L'AQUILA	11
TERAMO	3939
PESCARA	146
ABRUZZO	4096

SOMME EROGATE AL 17/07/2017	€ 11.610.325,85
STIMA SPESE DA SOSTENERE AL 30/08/2017	€ 14.210.733,30
STIMA SPESE DA SOSTENERE AL 30/10/2017	€ 17.210.733,30

Totale persone assistite (Strutture ricettive+CAS): 5488



GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

S.A.E.
(Strutture abitative di emergenza)
Aggiornamento al 25/07/2017

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAVORI	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
TORRICELLA SICURA	40 mq	8	-	-	40 mq	8	1.044,45	334.224,00	verifica anomalia 20/7/17	lavori consegnati in data 24/07/17
	60 mq	28	1.044,45	1.754.676,00	60 mq	28	1.044,45	1.754.676,00		
	80 mq	12	1.044,45	1.002.672,00	80 mq	12	1.044,45	1.002.672,00		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate	1	1.201,12	72.067,20	60 mq isolate	1	1.201,12	72.067,20		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	49		2.829.415,20	TOTALE	49		3.163.639,20		
COLLEDARA	40 mq	9	1.044,45	376.002,00	40 mq	6	1.044,45	250.668,00	14/07/2017	gara fissata per il 31/7/17
	60 mq	15	1.044,45	940.005,00	60 mq	10	1.044,45	626.670,00		
	80 mq	10	1.044,45	835.560,00	80 mq	5	1.044,45	417.780,00		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	34		2.151.567,00	TOTALE	21		1.295.118,00		



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAYOUT	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
TOSCIA	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-	verifica anomalia 20/7/17 CONSEGNA IN DATA 09/05/2017 in attesa atti rettificati	lavori consegnati in data 24/07/17
	60 mq	29	1.044,45	1.817.343,00	60 mq	33	1.044,45	2.068.011,00		
	80 mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili	1	1.075,78	64.546,80	60 mq disabili	3	1.075,78	193.640,40		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	30		1.881.889,80	TOTALE	36		2.261.651,40		
CROGNALETO	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-	prevista per il 28/07/17	
	60 mq	12	1.044,45	752.004,00	60 mq		1.044,45	-		
	80 mq	1	1.044,45	83.556,00	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate	10	1.201,12	720.672,00		
	80 mq isolate	1	1.201,12	96.089,60	80 mq isolate	1	1.201,12	96.089,60		
	TOTALE	14		931.649,60	TOTALE	11		816.761,60		



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAYOUT	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
CORTINO	40 mq	4	1.044,45	167.112,00	40 mq	3	1.044,45	125.334,00	APPROVATO 10/7/17	gara fissata per il 31/7/17
	60 mq	9	1.044,45	564.003,00	60 mq	7	1.044,45	438.669,00		
	80 mq	1	1.044,45	83.556,00	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili	1	1.075,78	64.546,80	60 mq disabili	1	1.075,78	64.546,80		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate	5	1.201,12	240.224,00		
	60 mq isolate	4	1.201,12	288.268,80	60 mq isolate	3	1.201,12	216.201,60		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate	1	1.201,12	96.089,60		
	TOTALE	19		1.167.486,60	TOTALE	20		1.181.065,00		
MONTORIO AL VOMANO	40 mq	26	1.044,45	1.086.228,00	40 mq	10	1.044,45	417.780,00	12/07/2017	06/08/2017
	60 mq	16	1.044,45	1.002.672,00	60 mq	25	1.044,45	1.566.675,00		
	80 mq	1	1.044,45	83.556,00	80 mq	8	1.044,45	668.448,00		
	40 mq disabili	8	1.075,78	344.249,60	40 mq disabili	1	1.075,78	43.031,20		
	60 mq disabili	1	1.075,78	64.546,80	60 mq disabili	3	1.075,78	193.640,40		
	80 mq disabili	2	1.075,78	172.124,80	80 mq disabili	2	1.075,78	172.124,80		
	40 mq isolate	1	1.201,12	48.044,80	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	55		2.801.422,00	TOTALE	49		3.061.699,40		



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAYOUT	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
ROCCA SANTA MARIA	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-	APPROVATO IL 6/7/17	gara fissata per il 31/7/17
	60 mq		1.044,45	-	60 mq		1.044,45	-		
	80 mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili	1	1.075,78	64.546,80	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate	4	1.201,12	288.268,80	60 mq isolate	5	1.201,12	360.336,00		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	5		352.815,60	TOTALE	5		360.336,00		
CAMPOLI	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-		decreto di esproprio in data 13/06/17 - attesa verbali di immissione in possesto
	60 mq	6	1.044,45	376.002,00	60 mq		1.044,45	-		
	80 mq	4	1.044,45	334.224,00	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	10		710.226,00	TOTALE	0		-		



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAYOUT	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
CASTELLI	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-	RINUNCIA SAE	
	60 mq		1.044,45	-	60 mq		1.044,45	-		
	80 mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	0		-	TOTALE	0		-		
VALLE CASTELLANA	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-	IN ATTESA TRASMISSIONE ATTI DI ESPROPRIO e esigenze definitive	
	60 mq		1.044,45	-	60 mq		1.044,45	-		
	80 mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	0		-	TOTALE	0		-		



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAYOUT	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
CAPITIGNANO	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-	14/07/2017	gara fissata per il 31/7/17
	60 mq		1.044,45	-	60 mq	9	1.044,45	564.003,00		
	80 mq		1.044,45	-	80 mq	4	1.044,45	334.224,00		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili	2	1.075,78	129.093,60		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	0		-	TOTALE	15		1.027.320,60		
MONTEREALE	40 mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-		decreto di esproprio in data 24/07/17 - attesa verbale di immissione in possesso - richieste 13 SAE da 60 mq (3 paganica - 10 Capoluogo)
	60 mq		1.044,45	-	60 mq	10	1.044,45	626.670,00		
	80 mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40 mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60 mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80 mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40 mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60 mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate	3	1.201,12	216.201,60		
	80 mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	0		-	TOTALE	13		842.871,60		



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

comune	SAE da ordinativo			SAE da verbale consegna aree			APPROVAZIONE LAYOUT	CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	NOTE
	TIPO	Numero	costo /mq	importo	TIPO	Numero	costo /mq	importo		
CAMPOTOSTO	40mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-		Il sindaco ha optato per la sostituzione edilizia in attesa delle procedure per le SAEW
	60mq		1.044,45	-	60 mq		1.044,45	-		
	80mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	0		-	TOTALE	0		-		
BASCIANO	40mq		1.044,45	-	40 mq		1.044,45	-		24/07/2017 13/08/2017
	60mq		1.044,45	-	60 mq	3	1.044,45	188.001,00		
	80mq		1.044,45	-	80 mq		1.044,45	-		
	40mq disabili		1.075,78	-	40 mq disabili		1.075,78	-		
	60mq disabili		1.075,78	-	60 mq disabili		1.075,78	-		
	80mq disabili		1.075,78	-	80 mq disabili		1.075,78	-		
	40mq isolate		1.201,12	-	40 mq isolate		1.201,12	-		
	60mq isolate		1.201,12	-	60 mq isolate		1.201,12	-		
	80mq isolate		1.201,12	-	80 mq isolate		1.201,12	-		
	TOTALE	0		-	TOTALE	3		188.001,00		
N. TOTALE SAE DA ORDINATIVO			216		N. SAE DA VERBALI CONSEGNA AREE			222		
IMPORTO ORDINATIVO			€	12.826.471,80	IMPORTO			€	14.198.463,80	

STIMA SPESE EMERGENZA S.A.E. AL 30/ 10/2017 € 37.000.000,00



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

ACQUISIZIONE UNITÀ IMMOBILIARI

In ottemperanza del Decreto Legge 9 febbraio 2017 n. 8 art. 14 per fronteggiare la situazione di “Emergenza Abitativa” del territorio della Regione Abruzzo, con deliberazione n° 196 del 18 aprile 2017 della Giunta Regione Abruzzo, si è provveduto ad indire un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto di unità immobiliari da utilizzare per l'emergenza abitativa. Le offerte pervenute alla data di scadenza fissata al 29 maggio 2017 sono le seguenti:

SISMA 2016/2017 manifestazioni di interesse per l'acquisto di unità immobiliari		
Provincia	Numero	Note
L'aquila	13	
Teramo	51	Di cui 17 nella città di Teramo
Pescara	4	
TOTALE	68	

La Commissione di gara sta completando le operazioni di valutazione delle offerte e si prevede il completamento entro il 31 luglio 2017.



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

M.A.P.R.E.

(Moduli abitativi provvisori rurali d'emergenza)

Quadro del fabbisogno al 31/12/2016

COMUNE	PROV.	MODULI CONSEGNATI
Basciano	TE	1
Canzano	TE	1
Castellalto	TE	1
Teramo	TE	1
Valle Castellana	TE	1
TOTALE		5

Quadro del fabbisogno al 22/05/2017

COMUNE	PROV.	MODULI CONSEGNATI
Civitella del Tronto	TE	1
Isola del Gran Sasso	TE	1
Montorio al Vomano	TE	2
Teramo	TE	1
Torricella Sicura	TE	1
TOTALE		6

Quadro del fabbisogno al 6/07/2017

COMUNE	PROV.	ORDINATI	MONTATI
S. Egidio alla Vibrata	TE	1	0
Teramo	TE	1	0
Castel Castagna	TE	1	0
Civitella del Tronto	TE	1	0
Notaresco	TE	1	0
Castelli	TE	1	0
Basciano	TE	1	0
Totale		7	0

STIMA SPESE EMERGENZA AL 30/10/2017

MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)

€ 980.000,00

Fonte: Dipartimento Politiche Agricole



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

ZOOTECNIA
(Moduli stalle e fienili)

Quadro del fabbisogno al 31/ 12/2016

Comune	Prov.	Moduli ordinati				Moduli consegnati				Stato lavori
		Bovini carne	Bovini latte	ovini	fienile	Bovini carne	Bovini latte	ovini	fienile	
Torricella Sicura	TE	1			1	1			1	Lavori conclusi
Valle Castellana	TE			4	2			4	2	Lavori conclusi
Rocca S. Maria	TE			3	3			3	3	Lavori conclusi
Capitignano	AQ		1		1		1		1	Lavori conclusi
TOTALE	16	1	1	7	7	1	1	7	7	

Quadro del fabbisogno al 27/03/2017

Comune	Prov	Moduli consegnati				Stato lavori
		Bovini carne	Bovini latte	ovini	fienile	
Valle Castellana	TE			1	2	Lavori conclusi
Crognaleto	TE			1		Lavori conclusi
TOTALE	4			2	2	

Quadro del fabbisogno al 31/05/2017

Comune	Prov.	Moduli ordinati				Moduli consegnati				Stato lavori
		Bovini carne	Bovini latte	ovini	fienile	Bovini carne	Bovini latte	ovini	fienile	
Montorio al Vomano	TE	2		1						Fase istallazione
Bellante	TE	2								Fase istallazione
Teramo	TE	1								Fase istallazione
TOTALE	6	5		1						



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

RIEPILOGO

Moduli ordinati sulla base della OCDPC 393/2016 e accordo quadro Regione Lazio

Numero complessivo

Ordinati **n. 26**

Forniti **n. 21**

Moduli bovini da carne:

Ordinati **n. 6**

Forniti **n. 6**

Moduli bovini da latte:

Ordinati **n. 1**

Forniti **n. 1**

Moduli ovi caprini:

Ordinati **n. 10**

Forniti **n. 10**

Moduli fienili:

Ordinati **n. 9**

Forniti **n. 9**

COSTO MODULI FORNITI

Modulo	Costo unitario	Numero moduli	Importo Totale
Bovini da latte	46.777,94	1	46.777,94
Bovini da carne	47.161,46	6	282.968,76
ovicaprini	38.003,36	10	380.033,60
fienili	10.769,00	9	96.921,00
TOTALE		26	806.701,30



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

SMALTIMENTO DELLE MACERIE DERIVANTI DA CROLLI E/O DEMOLIZIONI DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Aggiornamento 17/07/2017

E' stato approvato e pubblicato sul BURA n. 73 del 21/06/2017 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva il *"Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione"* di cui all'art.28 del D.L. n. 189/2016 come modificato dal D.L. n. 8/2017.

Nell'ambito del Piano di gestione delle macerie, sono individuati n. 2 siti di deposito temporaneo

Impianti Provincia di L'Aquila:

- ✓ Sito di deposito temporaneo intercomunale – Comune di Capitignano (loc. Cava di Mozzano);

Impianti Provincia di Teramo

- ✓ Sito di deposito temporaneo comunale – Comune di Montorio (loc. Zona Industriale);

Previsione tonnellate di macerie da smaltire (totale Provincia di L'Aquila e di Teramo) : 100.000 t

Ditta Individuata dai comuni della Provincia di L'Aquila per la gestione dei materiali derivanti da crolli/demolizioni: "Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A" (ACIAM), con sede legale ad Avezzano (AQ), a prevalente capitale pubblico, tra le cui mansioni presenta raccolta, scarico, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali inclusi tossici e nocivi, come identificati dalle vigenti leggi.

La ditta ACIAM ha confermato con nota Prot. n. 8593 del 21/06/2017 la propria disponibilità a gestire i servizi connessi all'attuazione del Piano Macerie e gestione del Deposito Temporaneo Intercomunale di Capitignano, applicando la tariffa di 84,00 €/ton, comprensiva di: investimento per la realizzazione del SIT e del trattamento e avvio a recupero/smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto esitanti dalla selezione delle macerie

In data 08/06/2017 è stato Siglato il protocollo di intesa tra Regione e i comuni di Campotosto, Capitignano e Monteverde per il sito di deposito temporaneo intercomunale delle macerie Comuni interessati alla problematica dello smaltimento delle macerie della Provincia di L'Aquila (Campotosto, Capitignano e Monteverde) *"Sisma Centro Italia 2016 - Protocollo di intesa - Sito di deposito temporaneo intercomunale - D.L. 17/10/2016, n. 189 - Legge 15/12/2016, n. 229 - D.L. 09/02/2017, n. 8 - Legge 07/04/2017, n. 45"*, in cui viene individuato il SDTI nel Comune di Capitignano, vengono stabiliti oneri, costi e responsabilità.

In data 28 giugno si è svolta una riunione tecnica con la ditta ACIAM S.p.A. per discutere dello stato dell'arte della redazione del progetto definitivo e degli aspetti burocratici legati alla stipula del contratto con cui si affida alla già citata ditta ACIAM S.p.A. la gestione dei servizi connessi all'attuazione del Piano di Gestione Macerie, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul BURA del 21/06/2017. A seguito di tale incontro, la ditta ha trasmesso la Proposta Tecnico-economica con allegata la seguente documentazione:

- Piano preliminare di gestione delle macerie;



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

- Quadro economico di determinazione dei costi di rimozione, trasporto e recupero delle macerie;
- Planimetria con layout del deposito temporaneo in località Mozzano nel Comune di Capitignano;
- Quadro economico opere civili;
- Cronoprogramma delle attività.

In data 4 Luglio 2017 presso gli uffici del Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, a Pescara si è svolta una riunione tecnica con la società ACIAM Spa, in merito all'affidamento della gestione dei servizi connessi all'attuazione del "Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione". In questa occasione l'Amministratore delegato della società, Alberto Torelli, ha illustrato il progetto per l'allestimento del "sito di deposito temporaneo intercomunale" (SDTI) in località Capitignano (AQ), giusto Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 08/06/2017 dalla Regione Abruzzo e dai Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto; il progetto appare coerente con le prescrizioni del Piano Regionale Macerie di cui al DPGR 20 giugno 2017, n.7.

Lo Schema di Contratto per ditta ACIAM S.p.A. per la gestione dei servizi connessi all'attuazione del Piano di Gestione Macerie relativo al sito in Località Mozzano di Capitignano (AQ) è stato inviato all'ANAC (prot. n.9192 del 07/07/2017), per revisione e eventuali osservazioni. Alla data odierna si è in attesa di riscontro.

In data 14 luglio la ditta ACIAM S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo per l'allestimento del SDTI di Capitignano (AQ)


Avezzano, 14/07/2017
Prot. 3264



Alla Regione Abruzzo
"Gestione Macerie"
c.a. Dott. Franco Gerardini
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
e p.c.
Alla Regione Abruzzo
Protezione Civile-COR L'Aquila
c.a. Dott. Antonio Iovino
sisma2016@regione.abruzzo.it
Al Comune di Capitignano
c.a. Sindaco
comune.capitignano@postecert.it

Oggetto: Sisma Centro Italia. Affidamento gestione dei servizi connessi all'attuazione del "Piano delle macerie e gestione sito deposito temporaneo intercomunale Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto". **Trasmissione Progetto Definitivo SDTI.**

In relazione all'oggetto, ed all'iter in corso, nonché facendo seguito al "Verbale di riunione" del 04/07/2017, si trasmettono in allegato a codesto Servizio gli elaborati progettuali, con firma digitale ed in formato pdf, relativi alla realizzazione del sito di deposito temporaneo intercomunale, ubicato nel Comune di Capitignano in località Cava di Mozzano, per la sua approvazione.

Cordiali Saluti

A.C.I.A.M. S.p.A.

(Alberto Torelli)

Allegati:

* 30 ELENCO DEGLI ELABORATI - luglio 2017 - signed.pdf	* T-01 COROGRAFIA - signed.pdf
* CNT-01 ELENCO PREZZI UNITARI - signed.pdf	* T-02 PLANIMETRIA CATASTALE - signed.pdf
* CNT-02 COMPUTO METRICO - signed.pdf	* T-03 PIANO GENERALE - signed.pdf
* CNT-03 QUADRO ECONOMICO PROGETTIVO - signed.pdf	* T-04 PIANO QUOTAZIONE ATTUALE - signed.pdf
* CNT-04 CRONOPROGRAMMA - signed.pdf	* T-05 PIANO QUOTAZIONE PROGETTO E SEZIONE - signed.pdf
* CNT-05 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - signed.pdf	* T-06 TETTOIA DI PROTEZIONE CASSONE MACERIE - signed.pdf
* R1-01 RELAZIONE INQUADRAMENTO AMBIENTALE.pdf	* T-08 PARTICOLARE OPERE D'ARTE - signed.pdf
* R1-02 RELAZIONE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO - signed.pdf	* T-09 ARCHITETTURA E PROGETTO INTERNO - signed.pdf
* R1-03 RILIEVO FOTOGRAFICO - signed.pdf	* T-10 CONTENITORE E SPOGLIATOIO - signed.pdf
* SC-01 PLANIMETRIA DI CANTIERE - signed.pdf	* T-11 NERAZZAZIONE - signed.pdf
* SC-02 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - signed.pdf	
* SC-03 INCENDIO DELLA MANO D'OPERA - signed.pdf	
* SC-04 ANALISI DEI RISCHI - signed.pdf	
* SC-05 ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA - signed.pdf	
* SC-06 FASCICOLO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA Dlg 81-2008 - Allegato XII - signed.pdf	

Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana
Via Edison 27 67051 Avezzano (AQ) Tel. 0863.441345 - Fax 0863.440551 e-mail: segreteria@aciam.it - aciamspa@pec.it
P. I.V.A. 01301940699 - Cod. Fisc. e Reg. Imp. L'Aquila 90012310861 - REA 99102 AQ Cap. Soc. € 258.743,04 I.V.



GIUNTA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

A seguito della diffusione a tutti i comuni dell'Abruzzo, ASL, VVF, Carabinieri Forestale e ARTA, della Circolare emanata con Prot. 5137 del 25/03/2017, avente ad oggetto: *“Eventi sismici del 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Procedure operative per la gestione dell'amianto”*, sono pervenute n. 213 schede di segnalazione della presenza di amianto, così distribuite sul territorio regionale:

COMUNE	PROVINCIA	NUMERO DI SCHEDE PERVENUTE
Barete	AQ	1
Campotosto	AQ	1
L'Aquila	AQ	1
TOTALE PROVINCIA DI L'AQUILA		3
Ancarano	TE	2
Arsita	TE	8
Atri	TE	4
Basciano	TE	40
Bellante	TE	11
Bisenti	TE	4
Campoli	TE	12
Canzano	TE	1
Castel Castagna	TE	2
Castellalto	TE	11
Castelli	TE	5
Castiglione Messer Raimondo	TE	11
Cellino Attanasio	TE	2
Cermignano	TE	12
Civitella del Tronto	TE	12
Colledara	TE	21
Crognaleto	TE	3
Isola del Gran Sasso	TE	1
Montefino	TE	1
Montorio al Vomano	TE	6
Notaresco	TE	1
Penna Sant'Andrea	TE	9
Pietracamela	TE	1
Teramo	TE	15
Torano Nuovo	TE	9
Tossicia	TE	4
TOTALE PROVINCIA DI TERAMO		208
Penne	PE	2
TOTALE PROVINCIA DI PESCARA		2
TOTALE		213



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

SISMA 2016/2017 BILANCIO CONTABILITA' SPECIALE - TITOLARITA' COORDINATORE COR AGGIORNAMENTO AL 27 LUGLIO 2017		
	ENTRATE	USCITE
PRIMO ACCONTO TRASFERITO DAL DPC NAZIONALE - 21/09/2016	€ 1.000.000,00	
SECONDO ACCONTO TRASFERITO DAL DPC NAZIONALE - 03/11/2016	€ 1.900.000,00	
TERZO ACCONTO TRASFERITO DAL DPC NAZIONALE - 06/12/2016	€ 10.100.000,00	
QUARTO ACCONTO TRASFERITO DAL DPC NAZIONALE - 01/03/2017 - a fronte di € 10.000.00,00 richiesti.	€ 5.000.000,00	
QUINTO ACCONTO TRASFERITO DAL DPC NAZIONALE - 11/04/2017	€ 5.000.000,00	
SESTO ACCONTO TRASFERITO DAL DPC NAZIONALE - 12/07/2017	€ 30.000.000,00	
ANTICIPAZIONI TRASFERITE AI COMUNI ED ALLE PROVINCE - Decreto COR n. 33 del 30/11/2016 (pari alle richieste presentate dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali alla data del 30/11/2016)		€ 6.655.911,92
ANTICIPAZIONE AI COMUNI PER CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - Decreto n. 33 del 30/11/2016 - trasferite integralmente le somme richieste.		€ 399.592,55
STRUTTURE RICETTIVE - Pagate le fatture emesse fino al mese di maggio 2017 nella misura del 70% e il saldo (restante 30%) di alcune fatture emesse da ottobre 2016 ad aprile 2017		€ 7.675.001,51
SPESE DIRETTAMENTE DISPOSTE DAL CENTRO OPERATIVO REGIONALE (allestimento, trasporti, allestimento campo di Gisciano, etc)		€ 1.360.463,26
CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - Anticipazioni ai Comuni Decreto n. 33 del 10/02/2017 - Trasferite in ordine alle richieste presentate alla data del 06 febbraio 2017. (con vincolo di destinazione)		€ 2.403.796,56
CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - Anticipazioni ai Comuni Decreto n. 73 del 31/03/2017 - Trasferite in ordine alle richieste presentate alla data del 31 marzo 2017. (con vincolo di destinazione)		€ 2.727.962,14
ANTICIPAZIONI TRASFERITE AI COMUNI ESCLUSO IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - Anticipazioni ai Comuni Decreto n. 81 del 05/04/2017 - Trasferite in ordine alle richieste presentate alla data del 03 aprile 2017.		€ 1.345.000,00
CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - Anticipazioni ai Comuni Decreto n. 159 del 19/06/2017 - Trasferite in ordine alle richieste presentate alla data del 19 giugno 2017. (con vincolo di destinazione)		€ 2.348.253,95
CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) - Anticipazioni ai Comuni Decreto n. 180 del 12/07/2017 - Trasferite in ordine alle richieste presentate alla data del 12 luglio 2017. (con vincolo di destinazione)		€ 3.730.720,65
ANTICIPAZIONI TRASFERITE AI COMUNI ESCLUSO IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - Anticipazioni ai Comuni Decreto n. 200 del 21/07/2017 - Trasferite in ordine alle richieste presentate alla data del 19 luglio 2017.		€ 5.065.395,96
TOTALE	€ 53.000.000,00	€ 33.712.098,50
Acconto totale per Contributo di Autonomia Sistemazione al 27 luglio 2017	€	11.610.325,85
Acconto totale per Strutture Ricettive al 27 luglio 2017	€	7.675.001,51
SOMME RESIDUE SULLA CONTABILITA' SPECIALE al 27 luglio 2017	€	19.287.901,50



**GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE**

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

SISMA 2016/2017 SOMME RICHIESTE DA COMUNI E PROVINCE PER GESTIONE EMERGENZA	
SOMME RICHIESTE DA COMUNI E PROVINCE attraverso la compilazione dell'All. 2 della Circolare n. 44398 del 03/09/2016, integrata con circolare n. 64447 del 23/11/2016, delle spese ammissibili.	€ 38.503.376,93
SOMME GIÀ TRASFERITE AI COMUNI ED ALLE PROVINCE	€ 24.676.633,73
SOMME DA TRASFERIRE , previa verifica di congruenza e conformità così come disposto dal DPC con Circolare prot. n. 10494 del 10/02/2017 (Circolare rendicontazione spese effettivamente sostenute)	€ 13.826.743,20



GIUNTA REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE

COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE

sisma2016@regione.abruzzo.it

SISMA 2016/2017 STIMA FABBISOGNO FINANZIARIO AL 30/10/2017		
ENTE	REGIONE ABRUZZO - CENTRO OPERATIVO REGIONALE (C.O.R.)	
	VOCI DI SPESA	STIMA SPESE EMERGENZA
1	SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE *	€ 8.600.000,00
2	ALLESTIMENTO AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altra strutture)	€ 600.000,00
3	GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altra strutture)	€ 800.000,00
4	TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI	€ 100.000,00
5	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE e acquisizione immobili ex art. 14 del D.L. n.8 del 09 febbraio 2017**	€ 20.500.000,00
6	NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI	€ 4.000.000,00
7	MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA A TTRA VERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA *	€ 66.000.000,00
8	CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE *	€ 20.000.000,00
9	GESTIONE RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA SPECIFICA	€ 300.000,00
10	SOLUZIONI ABITATIVE PROVVISORIE DI EMERGENZA (S.A.E.)	€ 36.500.000,00
11	MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)	€ 560.000,00
12	CONTAINER (AD USO ABITATIVO E/O UFFICIO)	€ 200.000,00
13	EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO	€ 700.000,00
14	MODULI TEMPORanei PER STABILIZZAZIONE, ALIMENTAZIONE E MUNGITURA ANIMALI - CONSERVAZIONE LATTE	€ 1.280.000,00
15	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E. - M.A.P.R.E. - SCUOLE - CONTAINER ED ALTRE STRUTTURE MODULARI	€ 9.170.000,00
16	STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE	€ 350.000,00
17	GESTIONE MACERIE	€ 20.000.000,00
18	ONERI DI VOLONTARIATO (art. 9/10 L.194/01 liquidati dalla Regione)	€ 2.100.000,00
Interventi sulla viabilità del soggetto attuatore ANAS a cura del gestore Provincia di Teramo - autorizzazione Di.Coma.C. prot. n. 17607 del 08/03/2017		€ 8.489.555,00
COSTI DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA SISMA (OCDPC n.392 - 396 - 400/2016 - COR, COC e Province)		€ 1.600.000,00
Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo - art. 7 della O.C.D.P.C. n.438 del 16/02/2017		€ 220.000,00
STIME TOTALI		€ 202.069.555,00
*	La quantificazione della spesa tiene conto anche delle spese sostenute dai comuni del cratere conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici.	
	Si precisa inoltre, come comunicato al Dipartimento di Protezione Civile in data 27/06/2017, che la stima degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose per i Comuni del cratere ammonta ad € 45.924.842,62.	
**	E' in corso la valutazione delle offerte per l'acquisizione di immobili. Entro quindici giorni sarà possibile quantificare la spesa.	
